枕崎校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

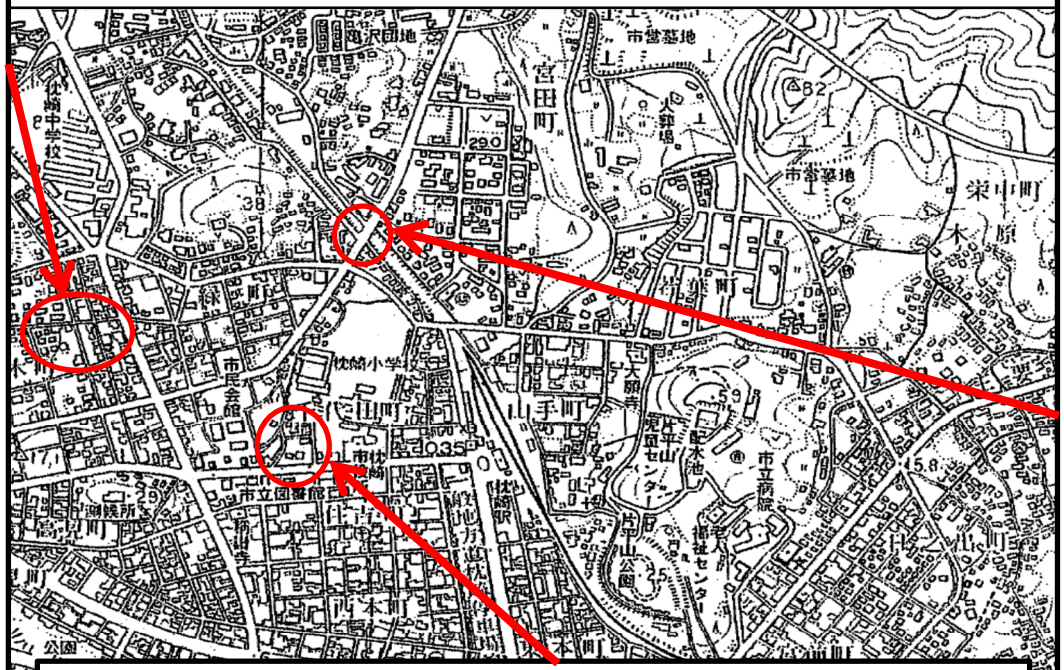

3　街路 104 の 1 号線桜木町信号付近

【危険の内容】

● 側溝のサイズも大きく蓋板もないため，車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も激しい。

【対策メニュー（対策実施済）】

○ 側溝の改修　（R1～R2 年度まで）

【事業主体】枕崎市

1　街路 216 号線

枕崎市役所，市民会館付近

【危険の内容】

● 「止まれ」の文字など道路表示が消えかかっていて見えにくい。

【対策メニュー（対策実施済）】

○「止まれ」等道路の文字の引き直し

【事業主体】枕崎市

2　越脇宝寿庵線　越脇橋付近

【危険の内容】

● 越脇橋を通り登下校する児童が車とぶつかりそうになるため大変危険。

【対策メニュー（対策検討中）】

○ 停止線と「止まれ」標識の新規設置

【事業主体】警察

枕崎校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

6　国道２２５号，小江平木場線　　小江平交差点付近

【危険の内容】

●　五叉路である上に傾斜が強く，雨天時には冠水する。

（交差点及び市道歩道内の流末排水路の断面不足のため交差点が冠水する。）

【対策メニュー（対策中）】

○　交差点内（国道）の排水路改修

○　歩道内の排水路改修に伴い，老朽化した歩道を含む道路改良を行う。（H31～R3 年度まで）

【事業主体】国，枕崎市

5　街路４号線　　枕崎小学校付近

【危険の内容】

●　歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み，ガードパイプの腐食も著しい。

【対策メニュー（対策中）】

○　舗装・側溝の改修及び歩道の拡幅（H31～R3 年度まで）

【事業主体】枕崎市

4　街路 3・6・15 号線（台場通線）

中央交差点から南へ港町 62 番地先

【危険の内容】

●　歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。

【対策メニュー（対策実施済）】

○　側溝・歩道の改修（H29～R2 年度まで）

【事業主体】枕崎市

枕崎校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

9　街路 69 号線　台場公園付近

【危険の内容】

● 側溝のサイズも大きく蓋板もないため，車両通行時に側溝に転落する可能性がある。側溝の老朽化も著しい。

【対策メニュー（対策予定）】

○ 側溝の改修，道路改良による歩行空間確保（R3 年度～）

【事業主体】枕崎市

8　街路 3・4・4 の 1 号線　台場公園付近

【危険の内容】

● 歩道内の舗装や側溝等の老朽化が進み，ガードパイプの腐食も著しい。

【対策メニュー（対策予定）】

○ 側溝・歩道の改修（R3 年度～）【事業主体】枕崎市

7　街路 55 号線　枕崎市立病院付近

【危険の内容】

● 大きな水路があり，また道路幅員も狭いため，離合の際に転落や接触の危険がある。

【対策メニュー（対策予定）】

○ 水路の暗渠化，道路改良による歩行空間確保（R3 年度～）【事業主体】枕崎市

10　街路 3・6・12 号線　枕崎駅付近

【危険の内容】

● 歩道が狭く、凹凸でつまずき倒れて車道に飛び出す危険がある。

【対策メニュー（対策予定）】

○ 側溝・歩道の改修による歩行空間確保（R3 年度～）【事業主体】枕崎市

桜山校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

2　神浦木浦線

東新化成付近の急な法面

【危険の内容】

● 歩道もなく、過去に倒木や崩土が発生しており、歩行者が危険である。

【対策メニュー（対策中）】

○ 法面の切り直し及び歩行空間の整備　R2 年度～

【事業主体】枕崎市

1　国道 225 号　桜山小学校前～平門交差点

【危険の内容】

● 歩道が狭くガードレールもない。特に，雨天時には，児童の傘が通過する車と接触しそうになる。

【対策メニュー（対策実施済）】

○ 該当箇所に横断防止柵を設置　R1～R2 年度まで

【事業主体】国

別府校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

1　県道打木谷白沢津線　枕崎知覧線　　中原交差点

【危険の内容】

● 交通量が多いため，道路の規制線や横断歩道等がだいぶ薄くなっており，見えにくくなっている。雨の日は特に見えづらい。

【対策メニュー（対策中）】

○ 道路標示の引き直し

【事業主体】　警察　県

立神校区通学路対策実施箇所図（対策実施中含む）

1　大堀牧園線　立神中学校付近 松田水産前

【危険の内容】

● 交差点で道路の幅が変わっており，業者のトラックが近くに駐車すると見通しが悪く危険である。

【対策メニュー（対策中）】

○ 減速表示等の設置

【事業主体】市

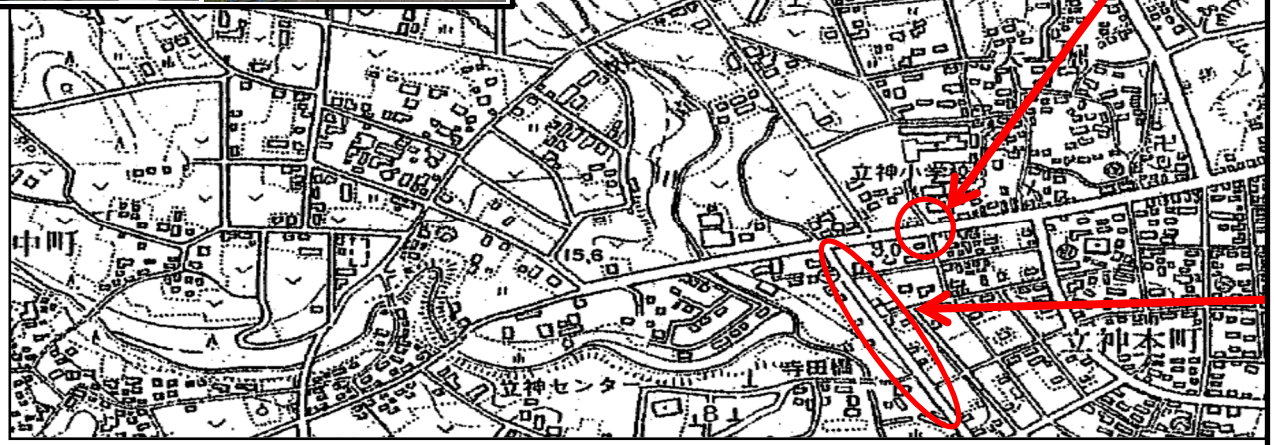

2　国道２２６号　立神小学校前

【危険の内容】

● 横断歩道の道路標示が薄くなっている。

【対策メニュー（対策中）】

○ 横断歩道の引き直し

【事業主体】警察

3　大塚馬追橋線

【危険の内容】

● 交通量が多く歩道がない。馬追川付近には歩道を設置しているが，国道までは延びていない。

【対策メニュー（対策実施済）】

○ 道路改良により歩道設置（H28～R２）

【事業主体】市
